


工事状況（令和6年5月）

○燃焼ガス冷却設備（2号炉）



ボイラ施工完了

○燃焼設備（2号炉）

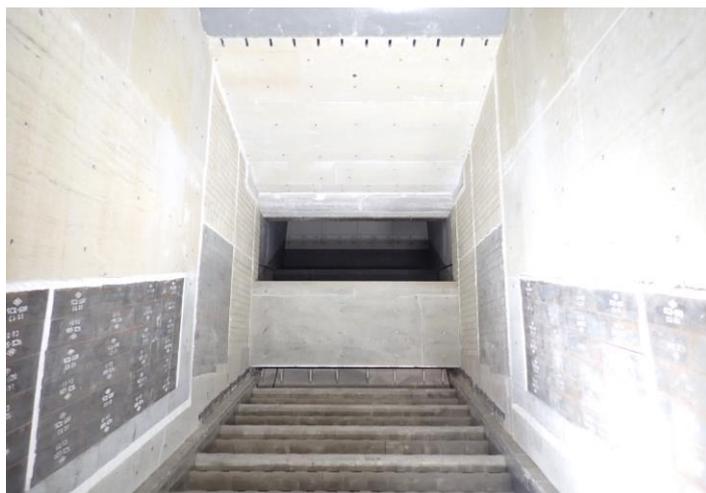

燃焼設備施工完了

○燃焼ガス冷却設備（2号炉）



ボイラ耐火物施工完了

○中央制御室



乾燥焚き状況

○炉内状況（2号炉）



試運転状況（実負荷運転）

◆令和6年6月～令和6年8月

- ・6月はボイラ保温工事、焼却炉ケーシング、ボイラ耐火物の施工を行いました。
- ・7月12日より乾燥焚き及び温水洗浄を行いました。
- ・8月より試運転（実負荷運転）を行っております。

◆令和6年9月～

- ・8月から引き続き試運転を行い、9月には予備性能試験、10月には引渡性能試験を行います。その後10月末には2号炉引渡しとなります。
- ・10月下旬より1号の解体を開始する予定です。
